



RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO Chiller - Italia

Da compilare per accettazione in ogni parte in modo chiaro e leggibile.

Alla ricezione sarà confermata nostra disponibilità per ottemperare a quanto da Voi richiesto.

Le richieste dovranno pervenire ad Assistenza Galletti SpA con almeno 8 giorni di anticipo sulla data prevista/richiesta.

La Ditta richiedente / acquirente l'unità da GALLETTI SpA

Nr. Fattura GALLETTI SpA di acquisto unità _____
Società _____
Via _____ Cap _____
Località _____ Prov. _____
Tel _____ e -mail _____

Dati Referente Operatore FGAS

Società _____
Nome/Cognome _____
email _____
P.IVA _____
Codice Fiscale _____

richiede l'intervento di primo avviamento con personale tecnico specializzato a

**Galletti Spa-Via Romagnoli 12/A-40010 Bentivoglio (Bo) Tel.051.8908111-Fax 051.8908122
email: assistenza@ghservice.it**

Dell'unità Modello _____ Matricola |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Installata presso:

Società/Ditta _____
Via _____ Cap _____ Località _____ Prov. _____
Data richiesta _____ All'avviamento sarà presente il Sig _____ Tel. _____

E' necessaria la compilazione della seguente tabella per confermare l'esecuzione, da parte dell'installatore, delle operazioni indicate, pena l'impossibilità di esecuzione del primo avviamento e la fatturazione dell'uscita del tecnico. Il tecnico non è autorizzato ad eseguire operazioni di installazione / collegamenti.

	Descrizione operazioni preliminari da eseguire a carico del cliente	SI	Verifica GALLETTI
1	Manuali d'uso schemi e certificati sono a corredo e le indicazioni sui manuali sono state rispettate		
2	La movimentazione dell'unità e suo posizionamento è stata realizzata secondo indicazioni del manuale d'uso.		
3	L'unità è accessibile in condizioni di sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs 81 e s.m. Gli spazi di rispetto ed accessibilità per la manutenzione sono garantiti, secondo gli spazi di installazione minimi da manuale d'uso		
4	Le canalizzazioni sono dimensionate in maniera adeguata e libere (se previste)		
5	Lo scarico condensa è collegato (se previsto)		
6	Le trasmissioni di vibrazioni sono state limitate inserendo idonei accorgimenti		
7	L'impianto è stato collegato alla macchina, è riempito d'acqua e sfiato d'aria in maniera adeguata		
8	La pompa di circolazione acqua è funzionante ed il suo senso di rotazione è corretto		
9	La portata d'acqua è garantita adeguatamente		
10	Il filtro entrata acqua agli scambiatori è stato installato (necessario)		
11	Sono state predisposte secondo istruzioni allegate le soluzioni impiantistiche segnalate per le unità corredate di desurriscaldatori o recuperi di calore		
12	Il preriscaldamento dei carter/compressori è inserito da almeno 24 ore (se previste)		
13	La sezione dei cavi di alimentazione elettrica è di corretto dimensionamento		
14	L'alimentazione elettrica corrisponde a valori nominali (tensione, numero fasi e frequenza)		
15	Il collegamento di terra è stato effettuato (se previsto)		
16	Lo spegnimento unità viene realizzato tramite pannello remoto o per consensi esterni		
17	Le linee frigorifere sono state correttamente dimensionate, posizionate, collegate adeguatamente pulite**		
18	Sono state realizzate le prove di tenuta e vuoto nelle linee frigorifere**		
19	Sono stati eseguiti correttamente i collegamenti elettrici tra le due unità**		
20	Gli obblighi relativi alla EN 378 - 3 per unità frigorifere contenenti refrigeranti classificati A2L sono rispettati		

Data _____ NOTE: _____


ATTENZIONE

Rimangono a carico del richiedente la completa carica di refrigerante necessaria al regolare funzionamento per unità splittate e/o consegnate con pressatura in azoto. Gli oneri sostenuti per la mancata o incompleta effettuazione delle verifiche sopra riportate verranno addebitati. Il Centro Assistenza Tecnica è tenuto a verificare unicamente il corretto funzionamento macchina oltre a verificare quanto compilato dal richiedente nelle apposite caselle di "Verifica GALLETTI". A cura del cliente predisporre l'unità accessibile o i mezzi per raggiungerla in sicurezza. Non sarà possibile espletare l'intervento di assistenza in caso di installazione non conforme alle condizioni di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. I costi sostenuti in caso di intervento non eseguito saranno comunque corrisposti dal committente. Eventuali fatturazioni seguiranno a tariffe in vigore e con condizione di pagamento 30 gg df.

** solo per unità splittate

Ulteriori informazioni di installazione:

a terra su tetto su soppalco
____ mt. di altezza presenza parapetto
 presenza ganci per imbracatura
modo di raggiungimento: _____

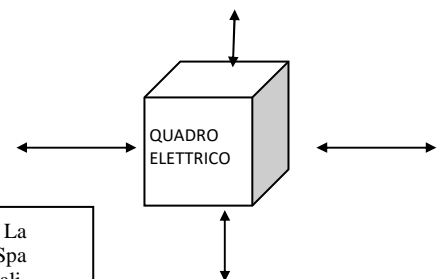

Timbro e firma leggibile per accettazione

A norma di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati da Galletti Spa per finalità relative all'adempimento degli obblighi contrattuali.
